Организация строительства Автоматической АЗС ИНИТ
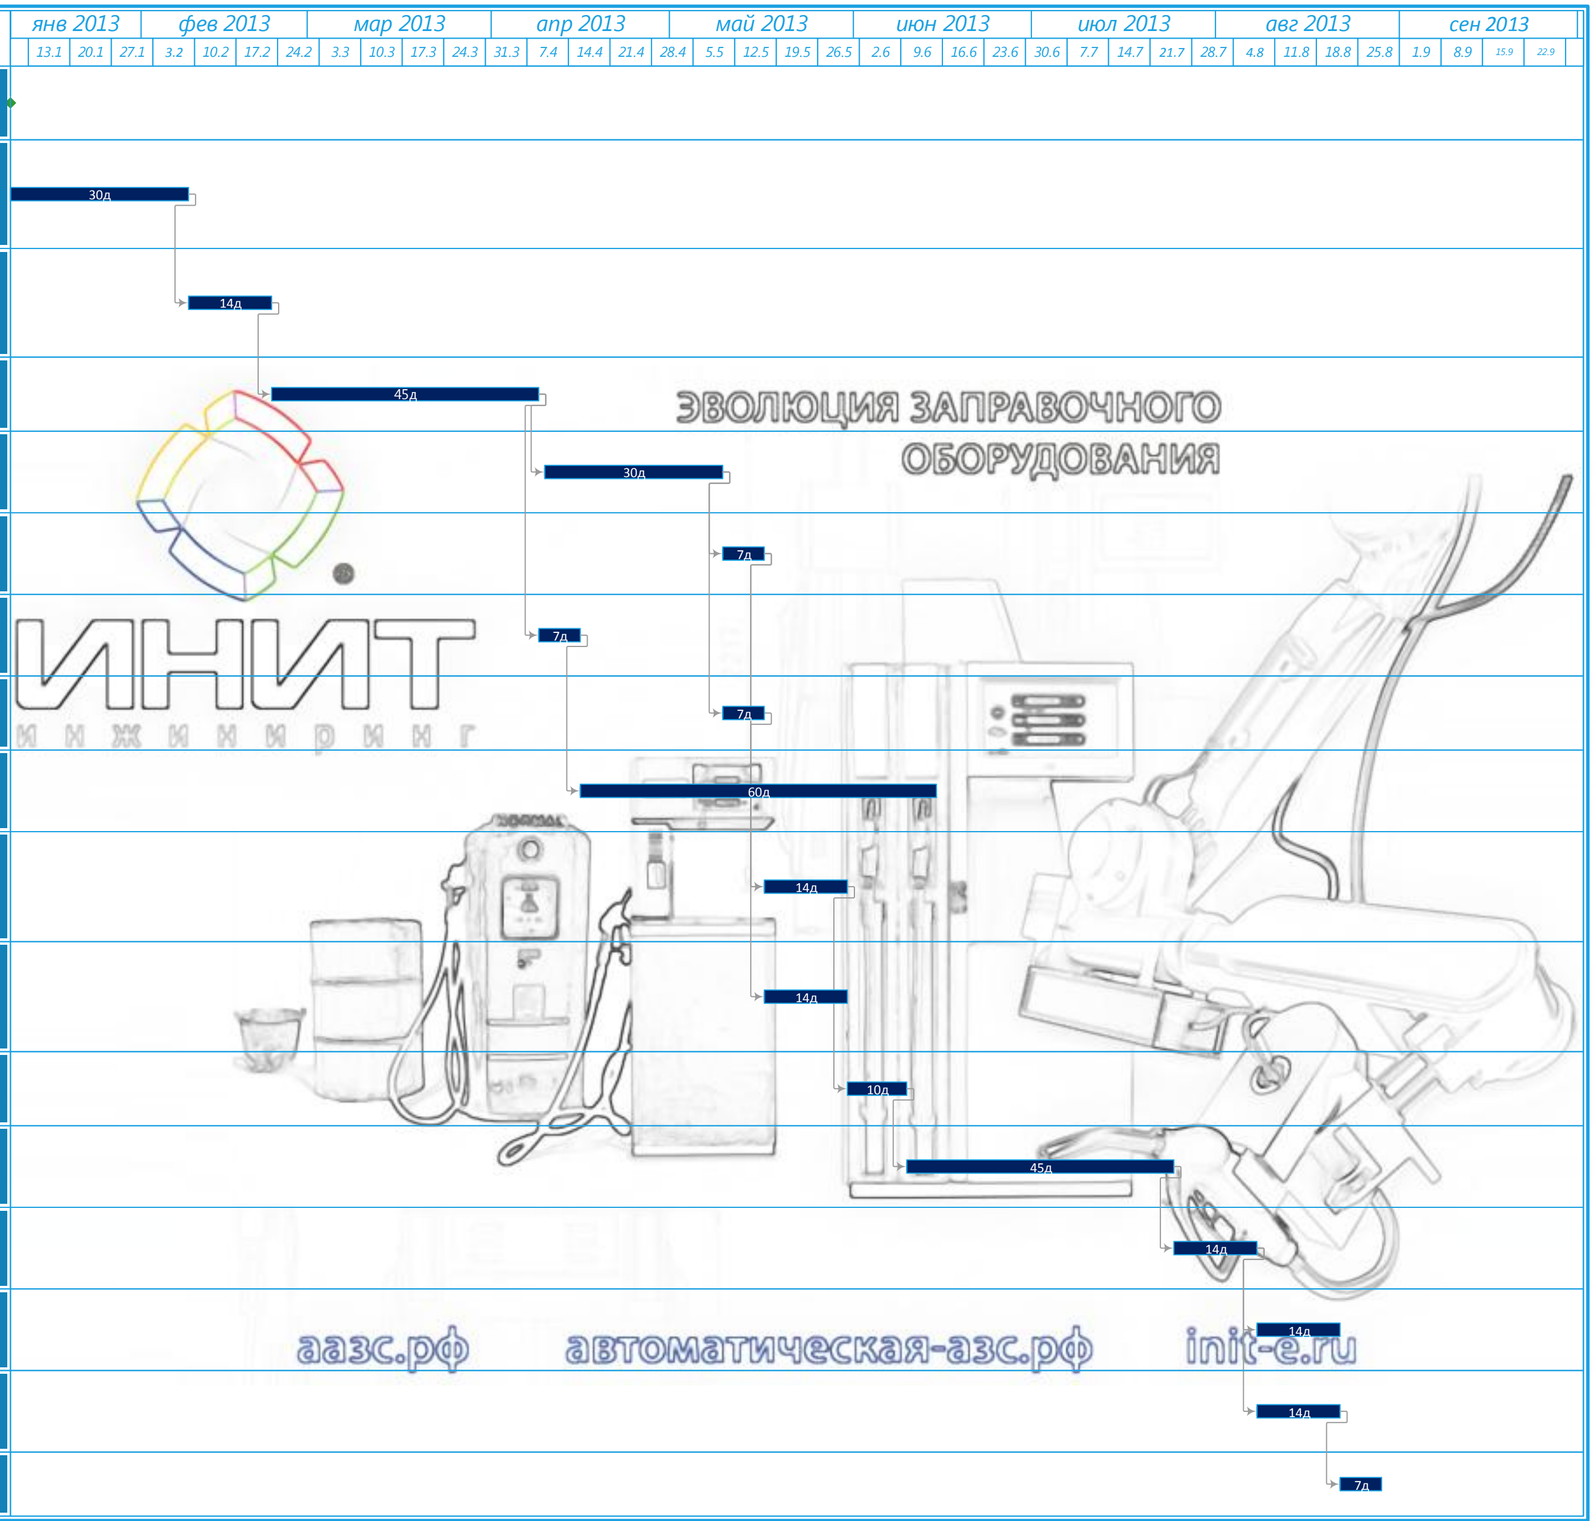
№	Название задачи	Длительность	Заметки для задачи
1	Отвод, межевание земли	0д	
2	Оформление градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ)	30д	Градостроительный кодекс РФ ст.44
3	Инженерные изыскания, пред проектные согласования	14д	См. «Перечень исходных данных для проектирования»
4	Проектирование	45д	Градостроительный кодекс РФ ст.48
5	Экспертиза проекта	30д	Градостроительный кодекс РФ ст.49
6	Получение разрешения на строительство	7д	Градостроительный кодекс РФ ст.51
7	Заключение договоров поставки	7д	
8	Заключение договоров подряда	7д	
9	Поставка оборудования	60д	
10	Подготовительные работы (выкорчевка, рекультивация)	14д	
11	Внеплощадочные сети (электроснабжение, интернет)	14д	
12	Общестроительные работы (нулевой цикл)	10д	
13	Строительно-монтажные работы	45д	
14	Пусконаладочные работы	14д	
15	Дорожные работы, устройство подъездов	14д	
16	Благоустройство, озеленение	14д	
17	Вод объекта в эксплуатацию	7д	Градостроительный кодекс РФ ст.55
